Машина Виктория Алексеевна
shavonnf

Тестовое задание

Задача 1

<u>Вопросы к заказчику и стейкхолдерам:</u>

- ***Блок 1: Бизнес и успех проекта***

1. Как выглядит «успешный результат» через 2 месяца пилота?
Кому: заказчик
Зачем: зафиксировать KPI
Риск: невозможно оценить успех проекта
Отсюда возникает дополнительный конкретный вопрос:
Как будет измеряться сокращение времени на составление программы? Какие базовые метрики зафиксированы до внедрения?
Кому: заказчик, методист, аналитик
Зачем: корректно настроить сбор метрик в системе и доказать эффективность решения после пилота
Риск: невозможность объективно оценить успех проекта, споры о результате

- ***Блок 2: Пользователи и процессы***

2. Какие сценарии использования самые частые (топ-3)?
Кому: педагоги, родители, аналитики
Зачем: сфокусироваться на ключевой ценности в пилоте
Риск: делаем сложную систему, но не решаем основную боль

3. Как сейчас происходит передача данных между специалистами?
Кому: педагоги, администраторы
Зачем: понять интеграции и точки потери данных
Риск: если не учтем реальные процессы, то система не приживется
Отсюда возникает важный вопрос:

Как должна работать синхронизация данных при конфликтах (например, два специалиста изменили один профиль)? Какой сценарий приоритетен: «последний изменил» или «требует подтверждения»?

Кому: тех. команда, педагоги, методист

Зачем: спроектировать логику разрешения конфликтов и минимизировать потерю данных

Риск: потеря важных данных о прогрессе ребенка, демотивация пользователей из-за пропажи введенной информации

4. Какой минимальный набор функций должен быть в пилотной версии, чтобы специалисты согласились перейти с привычных Excel/бумаги?

Кому: педагоги, психологи, тьюторы

Зачем: сфокусировать MVP на реальной ценности и обеспечить раннее принятие продукта пользователями

Риск: низкий уровень принятия, т.е. система технически готова, но ею не пользуются

Связанный вопрос:

Какие устройства и условия работы у пользователей (офлайн/онлайн)?

Кому: педагоги, тьюторы

Зачем: спроектировать UX и офлайн-режим

Риск: если система будет неудобной, то будет низкая вовлеченность

- ***Блок 3: AI-продукт***

5. Как сейчас выглядит «идеальная» индивидуальная программа?

Кому: методист, старший педагог

Зачем: понять эталон результата AI

Риск: AI будет генерировать «не то», что ожидают специалисты

6. Какие ошибки в рекомендациях AI недопустимы?

Кому: заказчик, методисты

Зачем: задать границы ответственности AI

Риск: юридические/этические проблемы, недоверие к системе

Отсюда возникает важный вопрос:

Какие критерии качества вы будете использовать для оценки рекомендаций AI-агента? Кто и как будет валидировать сгенерированные программы до их передачи ребенку?

Кому: методист, аналитик, заказчик
Зачем: определить метрики успеха AI-модели и прописать процедуру человеческого контроля
Риск: внедрение некорректных рекомендаций, снижение доверия специалистов, юридические риски

7. Кто принимает финальное решение по программе – AI или специалист?

Кому: заказчик
Зачем: определить роль AI (ассистент vs автономная система)
Риск: конфликт ролей, сопротивление пользователей

- ***Блок 4: Данные, безопасность и ответственность***

8. Какие поля/данные обязательны для диагностики, а какие – опциональны?

Кому: педагоги, психологи
Зачем: определить минимально жизнеспособный набор данных (MVP)
Риск: если система будет требовать слишком много данных, то пользователи не будут ей пользоваться

9. Какие требования по безопасности и хранению данных критичны?

Кому: заказчик, юристы, тех. команда
Зачем: соблюдение 152-ФЗ и архитектура хранения
Риск: блокировка проекта на уровне compliance

Отсюда возникает дополнительный вопрос:

Какие именно данные считаются персональными в вашем контексте, и как должна выглядеть процедура их анонимизации перед передачей в AI-агент?

Кому: заказчик, юрист, методист
Зачем: спроектировать корректный поток данных, соответствующий 152-ФЗ и внутренним политикам Сбера
Риск: нарушение законодательства, блокировка проекта на этапе проверки безопасности

10. Кто будет нести ответственность за ошибки в рекомендациях AI-агента: разработчик, методист, утверждающий программу, или организация?

Кому: заказчик, юрист, руководитель проекта

Зачем: прописать регламенты использования и разграничить зоны ответственности в документации

Риск: юридические претензии, блокировки использования системы специалистами

Дополнительно

Как я использую эти вопросы в работе:

Данный список вопросов используется не только для сбора требований, но и для проверки ключевых продуктовых гипотез:

- *где создается основная бизнес-ценность*
- *какой минимальный функционал даст результат уже в пилоте*
- *какие риски могут привести к отказу пользователей или блокировке проекта*

Ответы на эти вопросы позволяют:

- *сформировать MVP*
- *определить требования к AI-агенту*
- *заложить метрики оценки эффективности*
- *снизить продуктовые и юридические риски на раннем этапе*

Задача 2

Бизнес-процесс: Составление индивидуальной программы развития (ИПР) для ребенка

Ссылка на интерактивный User Flow в Figma с описанием каждого шага: https://drink-chaos-52135073.figma.site/

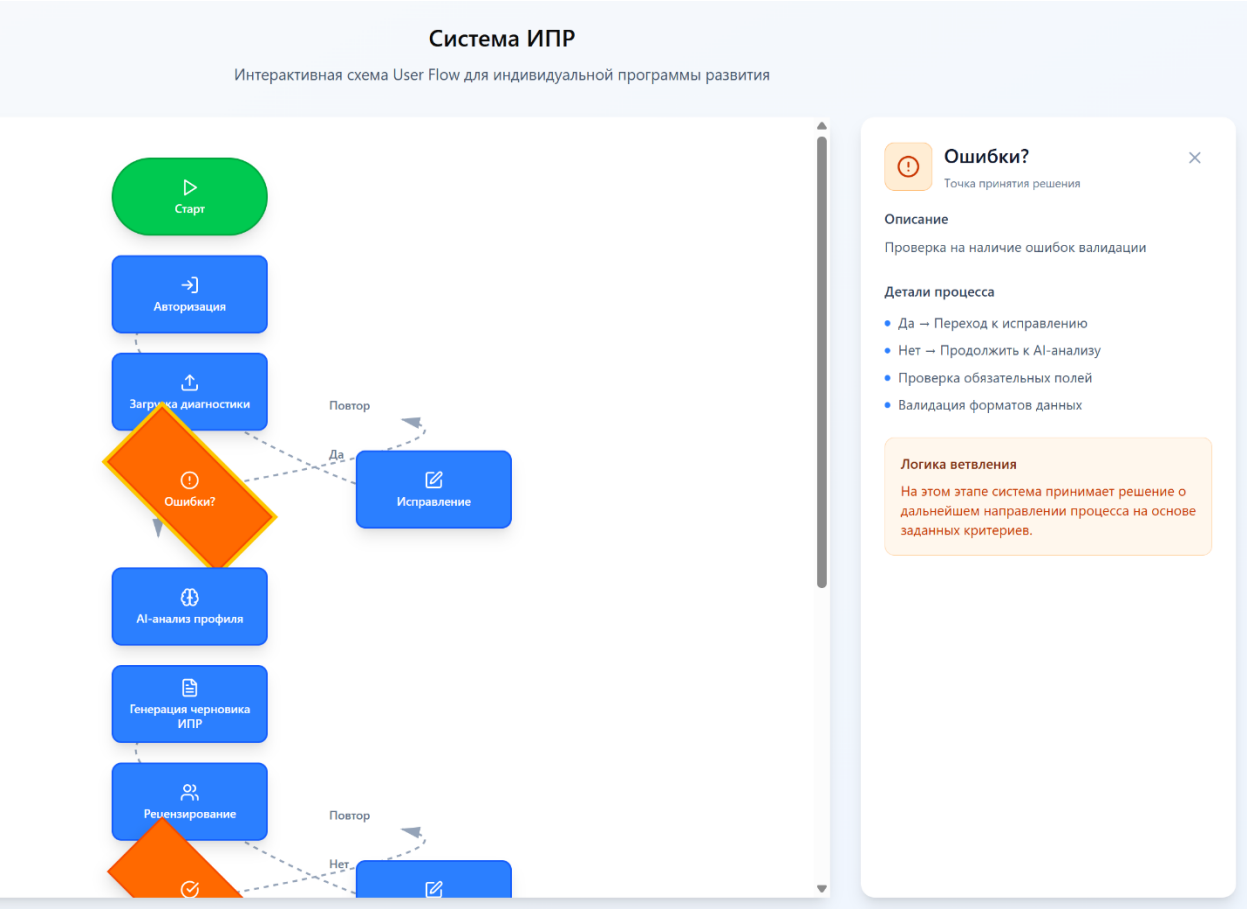

Задача 3

Дорожная карта пилота (2 месяца)

Веха	Срок	Критерии готовности	Кто вовлечен	Риски и меры
1. Финализация требований и дизайн-сессия	Неделя 1	• Утвержденный бэклог пилота • Прототипы ключевых экранов • Согласованные метрики успеха	Бизнес-аналитик, Заказчик, Методист, 2–3 педагога, Дизайнер	**Риск**: расхождение в ожиданиях. **Мера**: воркшоп с демонстрацией прототипа и фиксацией «что не делаем в пилоте»
2. Разработка MVP: ядро (ввод данных + AI-черновик)	Недели 2–3	• Рабочий прототип: загрузка, диагностики, черновик ИПР • Интеграция с GigaChat (тестовый контур) • Базовая валидация данных	Разработчики (Backend/Frontend), ML-инженер, Бизнес-аналитик	**Риск**: низкое качество рекомендаций AI. **Мера**: ограничить пилот 1–2 методиками (ABLLS-R), использовать rule-based + LLM, а не чистый генератив
3. Офлайн-режим + синхронизация + роли	Недели 4–5	• Работа формы ввода без интернета • Автоматическая синхронизация при подключении • Настроенные роли и права доступа	Разработчики, Тестировщик, Бизнес-аналитик	**Риск**: конфликты синхронизации. **Мера**: простая стратегия «последний изменяет» + лог изменений для ручного разрешения
4. Внутреннее тестирование + обучение пилотной группы	Неделя 6	• Пройдены сценарии тестирования (юзабилити, нагрузка) • Проведен тренинг для 5–7 специалистов • Готовые инструкции и чек-листы	Тестировщик, Методист, Тренер, Пилотная группа педагогов	**Риск**: сопротивление изменениям. **Мера**: вовлечь педагогов в тестирование, собрать обратную связь и показать, что их правки учитываются

5. Запуск пилота	Недели 7–8	• 5+ специалистов используют систему ежедневно • Собранные метрики: время на ИПР, удовлетворенность • Зафиксированные инциденты и план доработок	Все роли + Заказчик	**Риск**: технические сбои в реальных условиях. **Мера**: выделенный канал поддержки, ежедневный мониторинг, быстрый хотфикс-процесс
6. Подведение итогов и решение о масштабировании	Конец 8-й недели	• Отчет по метрикам (экономия времени, качество) • Список доработок для v2.0 • Решение заказчика о продолжении	Заказчик, Проектный менеджер, Бизнес-аналитик, Методист	**Риск**: неоднозначные результаты. **Мера**: заранее согласовать «порог успеха» (например, ≥25% экономии времени)

<u>Ключевые риски:</u>

Риск	Описание	Как предусмотреть
Низкое качество рекомендаций AI	Специалисты не доверяют системе	Валидация специалистом; использование шаблонов и правил; пилот на ограниченных кейсах
Низкое качество данных на входе	Педагоги вносят информацию неполно/с ошибками	Упростить формы ввода, добавить подсказки и валидацию в реальном времени, провести обучающий вебинар
Низкое принятие системы пользователями	Пользователи продолжают работать в Excel	Упрощенный MVP (1–2 ключевые функции); вовлечение пользователей; обучение и быстрый сбор обратной связи

Задача 4

Мы будем использовать **итерационный подход** (короткие циклы с регулярной проверкой результата на пользователях). Это позволит нам быстро принимать решения, минимизировать недопонимание между бизнесом и разработкой, вовлекать пользователей уже на ранних этапах и своевременно корректировать продукт в рамках пилота.

Какие конкретно виды встреч планируются:

Формат встречи	Частота	Участники	Цель	Фокус
Kick-off встреча	1 раз (старт проекта)	Вся команда, заказчик	Синхронизация целей, ожиданий, ролей	Цели проекта, KPI, зоны ответственности
Еженедельный статус (status meeting)	1 раз в неделю	PM, команда, заказчик	Контроль прогресса	Что сделано, что планируется, риски
Рабочие встречи (work sessions)	2–3 раза в неделю	Аналитик, разработчики, ML, дизайнер	Проработка требований и решений	Детализация задач, уточнение логики
Демо (demo / review)	1 раз в 1–2 недели	Команда, заказчик, пользователи	Показ результата	Проверка соответствия ожиданиям
Сбор обратной связи от пользователей	Регулярно (в пилоте)	Педагоги, методисты, родители, аналитик	Улучшение продукта	Удобство, полезность, проблемы
Ретроспектива	1 раз в 2 недели	Команда	Улучшение процесса	Что улучшить в работе команды

Каналы коммуникации:

- Мессенджер (оперативные вопросы, быстрые согласования)
- Таск-трекер (например, Bitrix) – задачи и статусы
- Документация (например, Google Docs) – требования и решения
- Демо-звонки – презентация результатов

Мотивация

1. Почему тебе интересен этот проект?

Мне интересен данный проект, так как он находится на пересечении образования, социальной сферы и технологий искусственного интеллекта, что делает его актуальным, профессионально насыщенным и перспективным для роста и личного развития.

В данный момент обучаюсь в области международного менеджмента образования, а также имею базовое педагогическое образование, поэтому тема разработки решений для повышения качества образовательной и коррекционной помощи детям с ОВЗ для меня профессионально значима.

Особенно ценно, что проект решает реальную проблему специалистов – высокую нагрузку и большое количество рутинной работы (как педагог я очень понимаю эту боль). Но самое главное – реализация этого проекта поможет детям. В этом состоит гуманистическая миссия данного продукта.

2. Как ты видишь свою роль в команде, которая создает продукт?

Я вижу свою роль как связующее звено (мост) между бизнес-задачами, пользователями и командой разработки. Чем именно я занимаюсь? В самом начале я глубоко погружаюсь в контекст специалистов, перевожу их боли в четкие требования и пользовательские истории. Далее, на основном этапе работы, я обеспечиваю приоритизацию, контролирую, что каждая фича решает конкретную задачу из кейса, а не «просто добавлена». А в конце я помогаю измерить результат через метрики, собрать обратную связь и подготовить решение к масштабированию.

Моя главная цель – чтобы продукт был не только технически исправным, но и реально используемым, потому что он упрощает жизнь тем, кто помогает детям, а главное – он улучшит жизнь самих детей и их будущее.

Так как для меня это первый практический проект в такой роли, я особенно заинтересована в быстром погружении, обучении и работе с обратной связью, чтобы максимально эффективно приносить пользу команде.

3. Сколько времени в неделю ты готов(а) уделять проекту и в течение какого периода?

Я готова уделять проекту в среднем 15-20 часов в неделю и работать в таком режиме на протяжении всего пилотного этапа (2 месяца), с возможностью дальнейшего участия в проекте при его развитии. Обозначенные рамки являются для меня комфортными в плане совмещения с работой и учебой, а также они позволят работать без потери мотивации к

проекту и сделать в итоге идеальный продукт. Однако, я также могу рассмотреть вариант расширения временных границ при конкретных условиях.
